

施工现场草签单

施工单位:

日 期:

现场草签单

工程名称	渭南市政协机关办公楼及 基础设施加固修缮项目	签证编号	004
签证部位	东配楼拆除工程	日 期	2025. 5. 14
<p>我施工单位现对渭南市政协机关东配楼进行拆改，现对东配楼一、二、三层现状拆改图及工程量进行三方单位签字确认。</p> <p>主要确认：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 东配楼一层墙体拆改、新建图； 2. 东配楼二层现状拆改图； 3. 东配楼三层现状拆改图； <p>（后附图纸，拆除工程量清单（此拆除工程量不含加固拆除，加固拆除包含在加固工程内））。</p> <p>共计：9 页。</p> <p>请予以确认！</p>			
施工单位代表签字	监理单位代表签字	建设单位代表签字	

东配楼三层工程量清单：

序号	部位	分项内容	单位	工程量	备注
1	三层拆除地 砖	地面瓷砖	m ²	166.04	
2	三层修缮吊 顶	石膏板吊顶	m ²	152.03	
3	三层拆除吊 顶	铝扣板吊顶	m ²	14.01	
4	三层拆除电 线		m	123.05	
5	三层拆除电 线管		m	37.20	
6	三层拆除墙 体	面层乳胶漆砖 墙	m ³	15.81	推倒
7	三层拆除墙 面	面层乳胶漆		62.44	起居室
8	三层拆除墙 面	面层瓷砖		65.55	厕所
7	三层拆除开 关		个	8	
8	三层拆除插 座		个	13	内含 1 个网线插口
9	三层拆除木 围墙		m ²	26.30	含走廊北侧木围墙
10	三层拆除射 灯		个	28	
11	三层拆除蹲 便台	4-5 轴西侧卫生 间	m ³	0.19	
12	三层拆除暖 气片	铸铁暖气片（14 片）	个	6	含走廊北侧暖气片
13	三层拆除灯	圆灯	个	9	内含 1 个长条日光灯
14	三层拆除空 调	挂式空调	台	3	含一个吊式风扇

15	三层拆除座便器		个	2	
16	三层拆除洗脸盆		个	3	
17	三层拆除拖把池		个	1	
18	三层拆除热水器		台	2	
19	三层拆除门		m ²	18.4	8 樘
20	二层拆除窗	C3520	m ²	42	6 扇
21	二层拆除窗	C1720	m ²	6.8	2 扇
22	二层拆除窗	C2520	m ²	5	1 扇
23	二层拆除窗	C2820	m ²	5.6	1 扇
24	二层拆除窗	C2020	m ²	32	8 扇


东配楼二层工程量清单：

序号	部位	分项内容	单位	工程量	备注
1	地面拆除	瓷砖拆除	m ²	164.1	所有地面
2	墙面拆除	瓷砖拆除	m ²	136.6	卫生间
3	二层拆除窗	C3520	m ²	42	6 扇
4	二层拆除窗	C1720	m ²	6.8	2 扇
5	二层拆除窗	C2520	m ²	5	1 扇
6	二层拆除窗	C2820	m ²	5.6	1 扇
7	二层拆除窗	C2020	m ²	32	8 扇
8	吊顶拆除	铝扣板拆除	m ²	30.06	卫生间
9	吊顶拆除	石膏板吊顶	m ²	57.61	走廊

东配楼一层工程量清单：

序号	部位	分项内容	单位	工程量	备注
1	地面拆除	瓷砖拆除	m ²	341.23	
2	墙面拆除	面层	m ²	20.61	开放式就餐区洗碗间
3	墙体拆除	推倒	m ³	5.26	就餐区 1
4	墙面拆除	面层	m ²	39.25	就餐区 1
5	墙面拆除	面层	m ²	109.42	操作间
6	墙面拆除	面层	m ²	25.59	操作间内洗碗间
7	墙面拆除	面层	m ²	23.40	包间卫生间
8	门拆除	门拆除	m ²	12.15	6 樘
9	窗拆除	C3520	m ²	131.25	2 扇
10	窗拆除	C1720	m ²	3.4	1 扇
11	窗拆除	C2820	m ²	5.6	1 扇
12	窗拆除	C0920	m ²	1.8	1 扇
13	窗拆除	C2118	m ²	11.34	3 扇
14	窗拆除	C1312	m ²	1.56	1 扇
15	吊顶拆除	石膏板吊顶	m ²	57.61	走廊

东配楼三层现状拆改图;

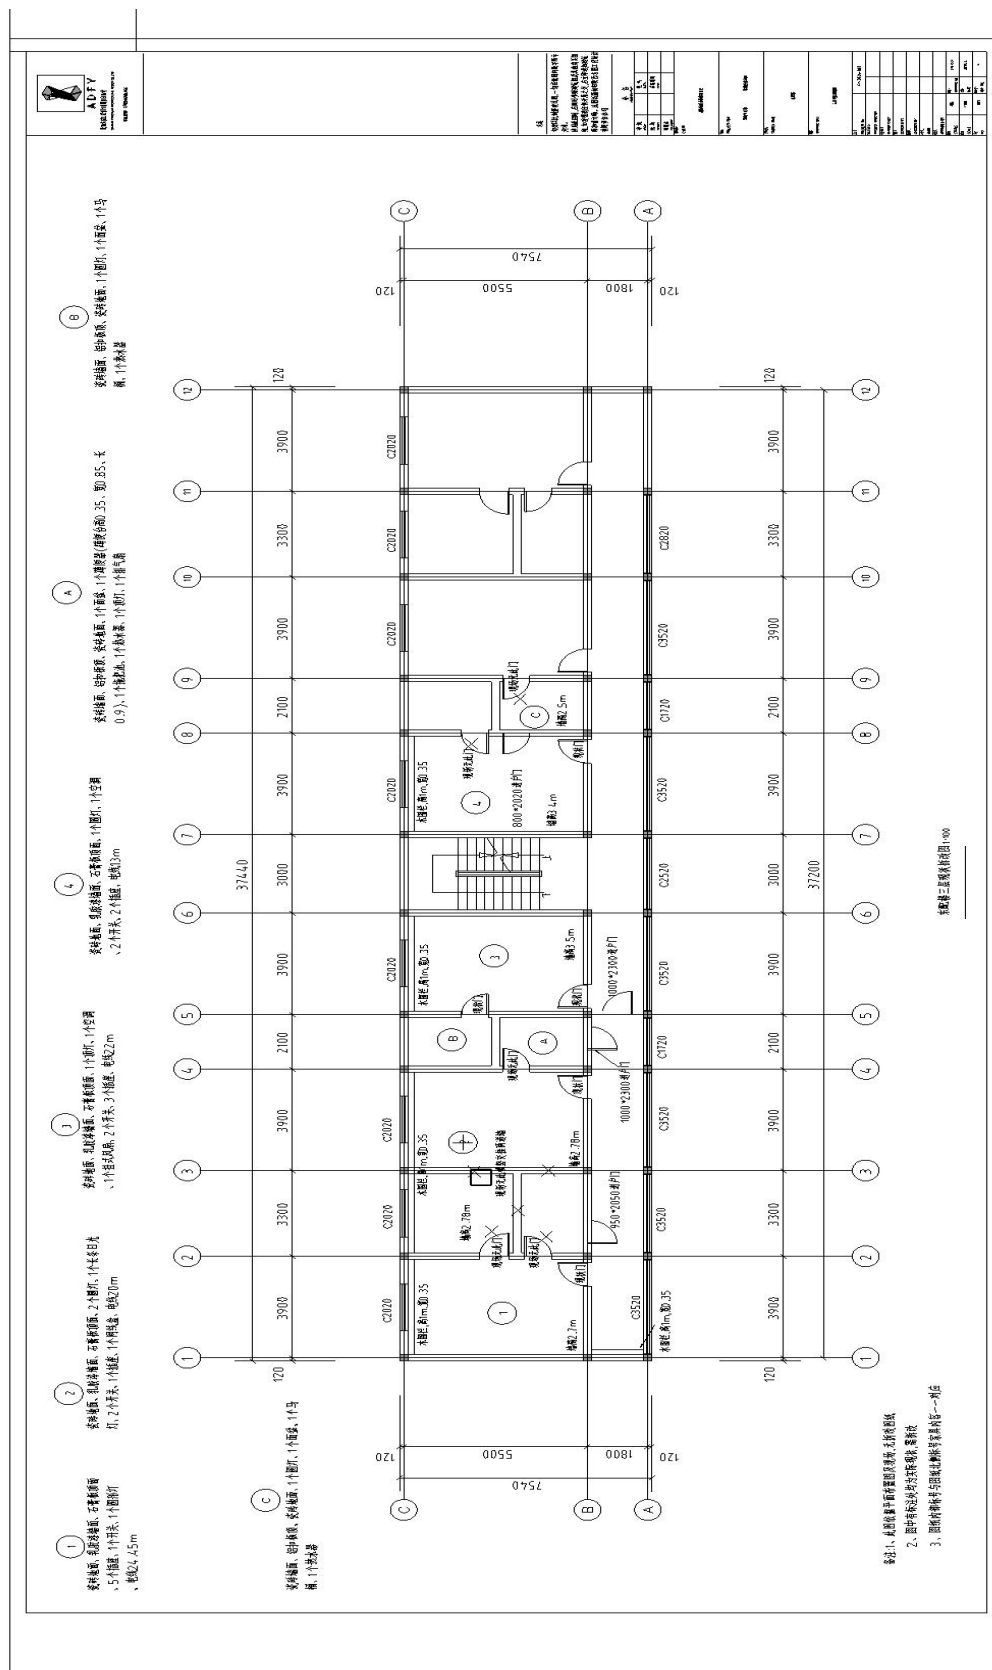

东配楼二层现状拆改图:

