



西安市体育训练中消防检测问题反馈单

一、高层监控室

1、监控室电器火灾监控部分测点剩余电流超量程

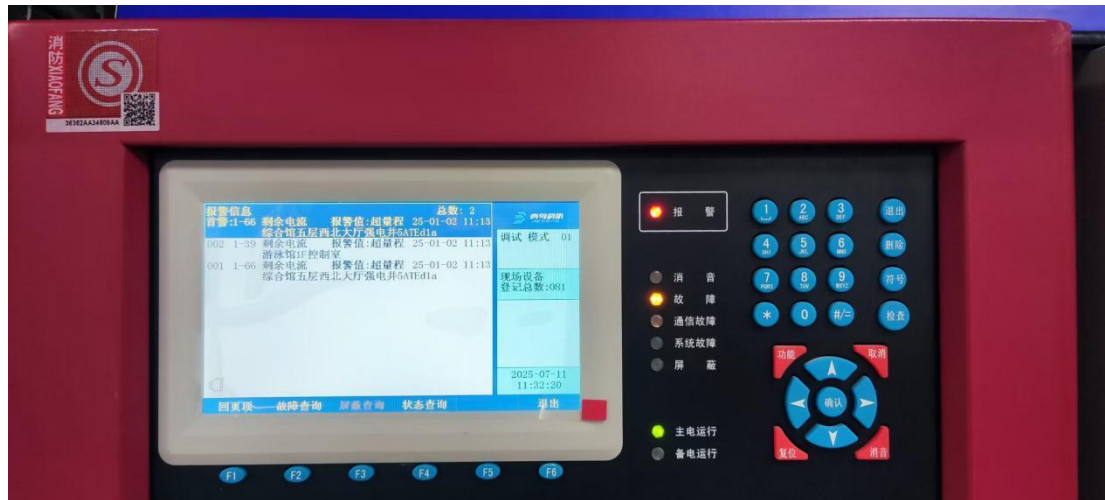

2、消防设备电源监控系统显示电压信号传感器供电中断

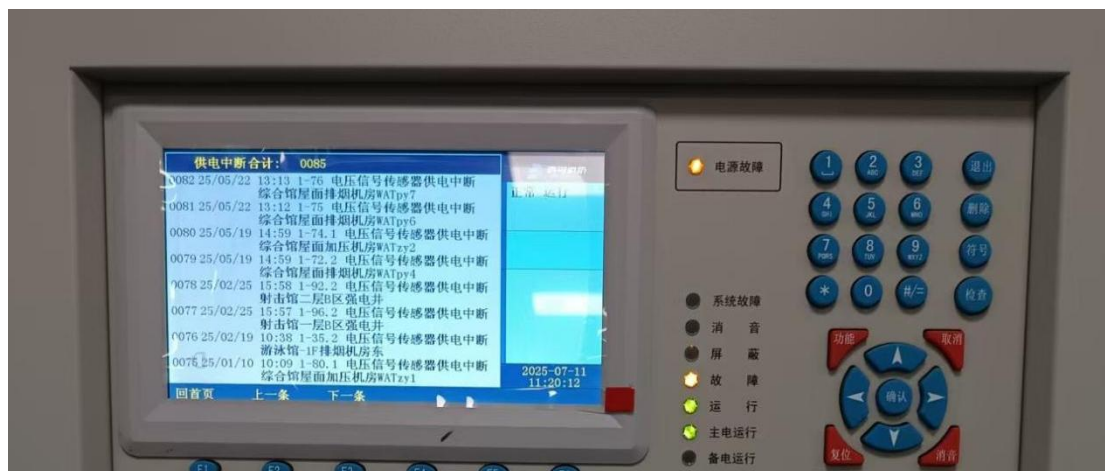

3、监控室消防电话分机 12 个报故障



4、防火门监控器，现场部分设备线路损坏，监控主机无法接收信号



5、余压监控主机没有和现场设备联网，主机显示注册设备数量为零

二、场馆监控室

1、监控室应急照明控制器故障，无法联动应急



2、电器火灾监控部分末端测量超量程 2 个



3、消防设备电源监控主机显示电压传感器供电中断 85 个



三、消防水系统

1、公寓楼屋面实验消火栓无消火栓按钮



2、湿式报警阀间个别信号阀模块误反馈



3、屋面喷淋增压泵自动启动后达到停泵压力值不能自动停止



4、屋面室内消火栓流量开关不能连锁启动消火栓泵



四、科研办公楼

1、科研楼联动测试，非消防供电未切断



2、联动测试消防电梯两部迫降到负二层，非消防电梯未迫降



3、联动测试走廊西边防烟分区排烟口打开后无风速



4、科研楼六层联动测试电动挡烟垂壁未动作



5、楼梯间电动防火门，联动后未关闭



6、科研楼电动挡烟垂壁 7 层到 13 层没有就地手动控制装置



7、楼梯间常开双扇防火门一扇缺少闭门器，整体缺少顺序器，无防火门常闭标识



8、科研楼单点测试，四楼触发火警，五楼楼层显示器显示火警

五、公寓楼

1、公寓楼 8 到 15 层挡烟垂壁无就地手动控制装置



2、宿舍公寓 416 门口烟感损坏



3、公寓楼灭火器配置不符合要求，应配置 5 公斤及以上干粉灭火器



4、公寓宿舍 4 层中间走廊电动挡烟垂壁手动控制装置升降无反应




5、公寓楼地下室消火栓主管网一个阀门关闭



6、14 层联动测试排烟口无风速



7、联动测试，走道东消防前室一台送风机未启动，风口无风速

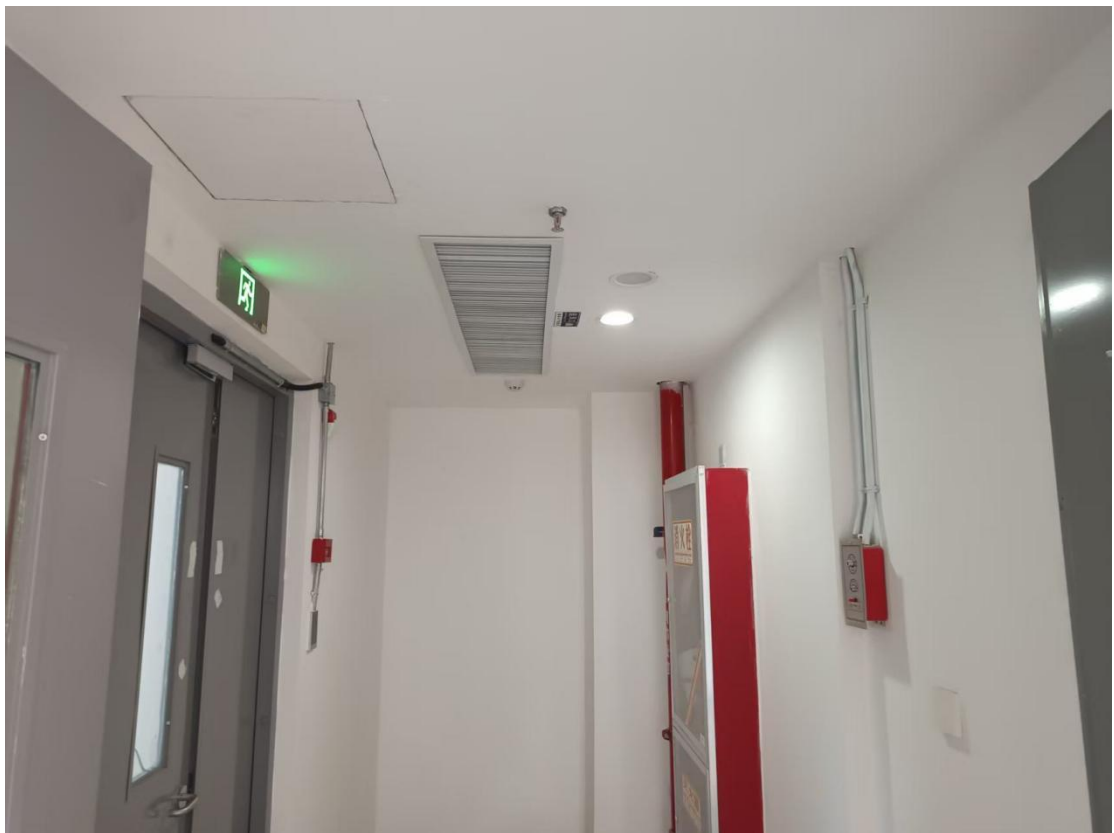

8、8层联动测试，排烟风机启动，风口无风速



9、5 层联动测试，风机启动，风口无风速（多数为阀体机械故障不能正常开启问题）



10、2 层联动测试，走道西排烟阀未正常开启，风口无风速



11、公寓楼一二层楼梯间消防管道阀门关闭（西）




六、田径馆

北馆

1、联动测试正常照明未断电，应急照明未启动



2、电动挡烟垂壁现场没有手动控制装置

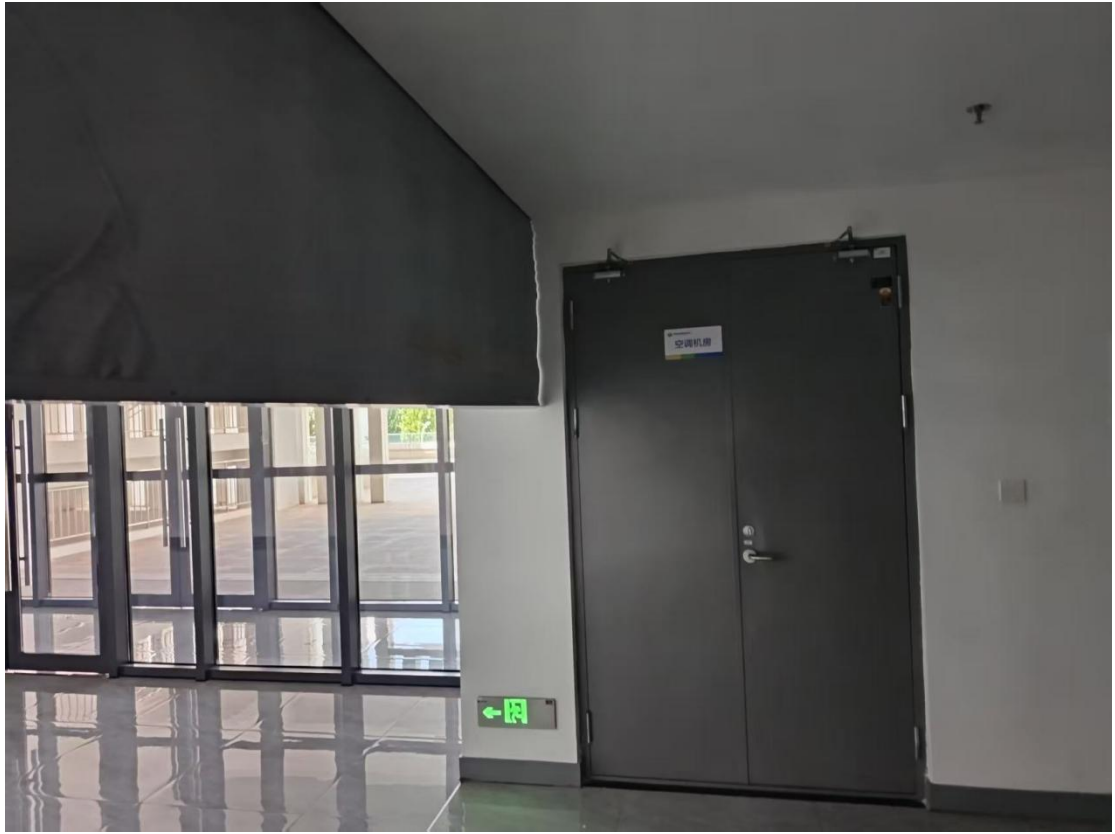


3、部分排烟口没有风速，可能是排烟阀未正常开启




南馆

1、联动测试正常强切，应急未启动

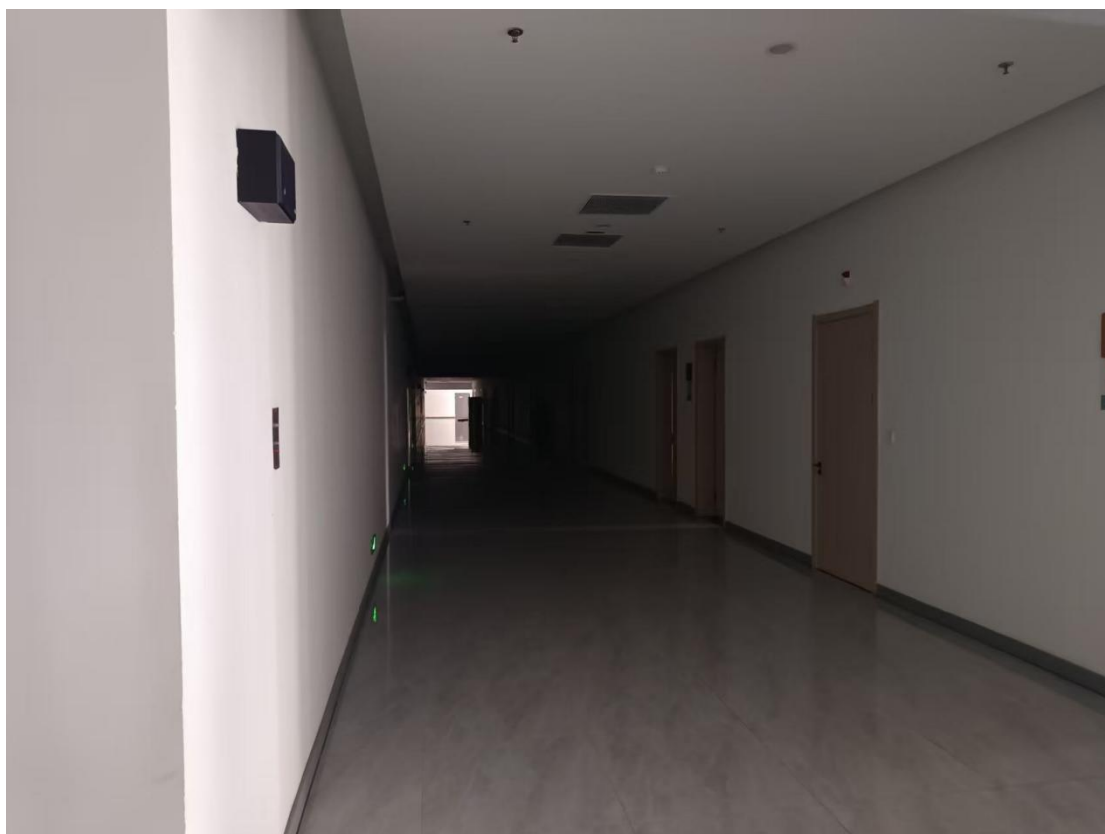

2、体能馆部分挡烟垂壁不能正常降落

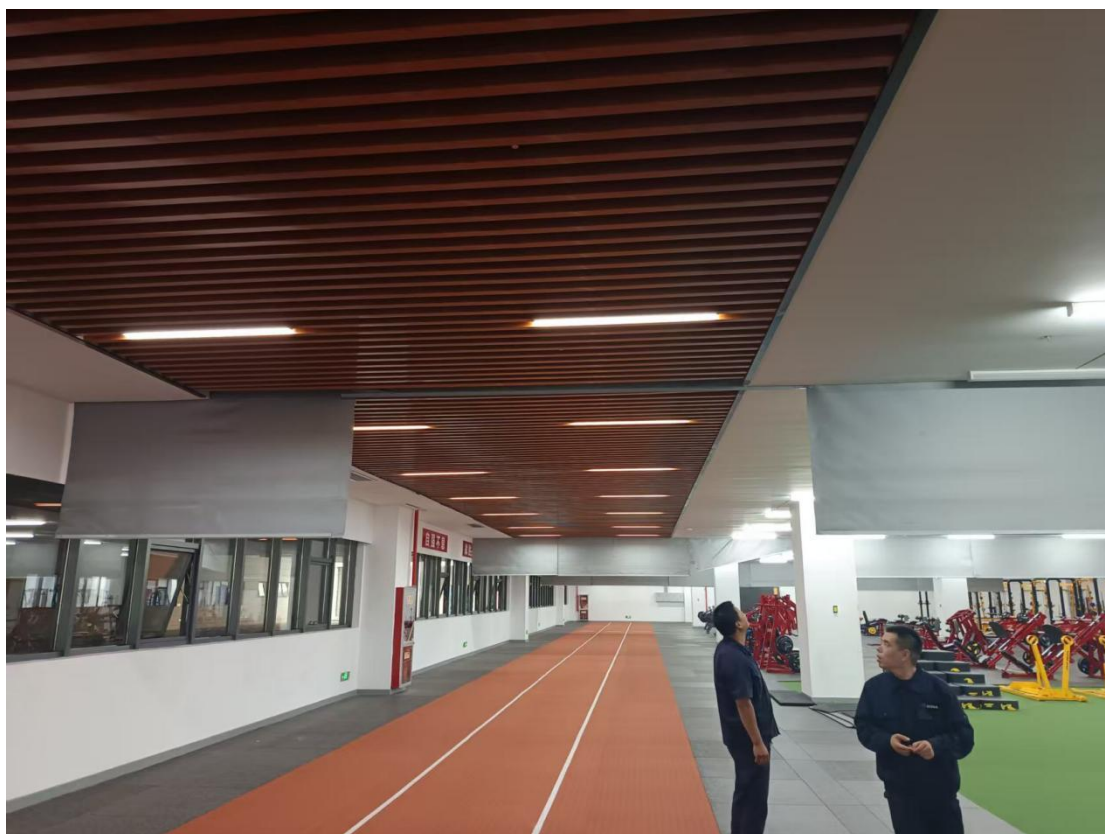

室外田径场

1、联动测试，走道个别排烟口往外吹风



七、综合训练馆

1、一层跆拳道训练馆多数烟感探测器保护罩未摘除




2、四楼联动测试，排烟风口无风



3、四楼走廊西边电梯前室送风机未启动



4、四楼正常照明灯没有联动熄灭

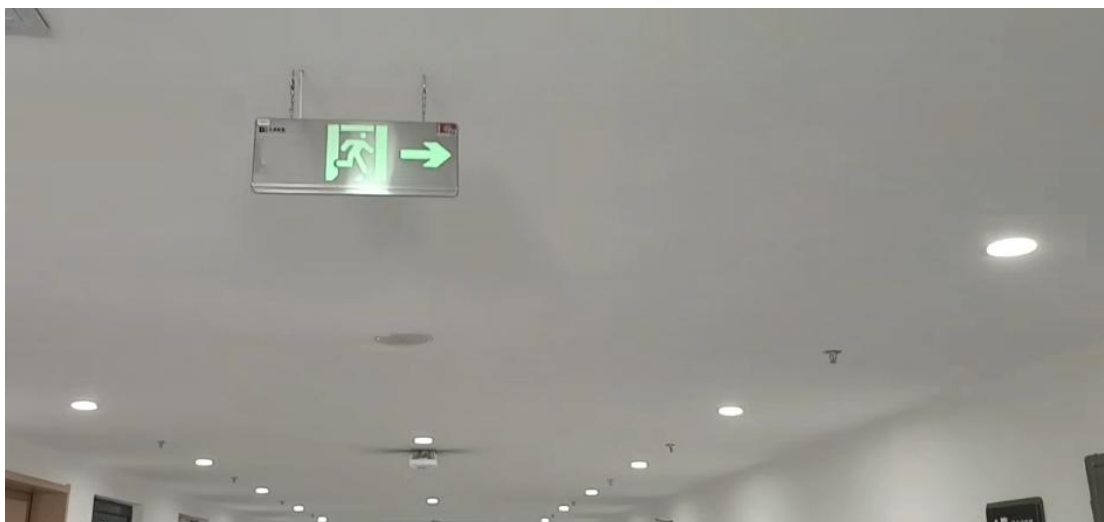


5、五楼联动测试，应急照明没有点亮




6、五楼联动测试，多数排烟系统未按照所划分的防烟分区正常启动

7、五楼乒乓球训练馆排烟风机未启动

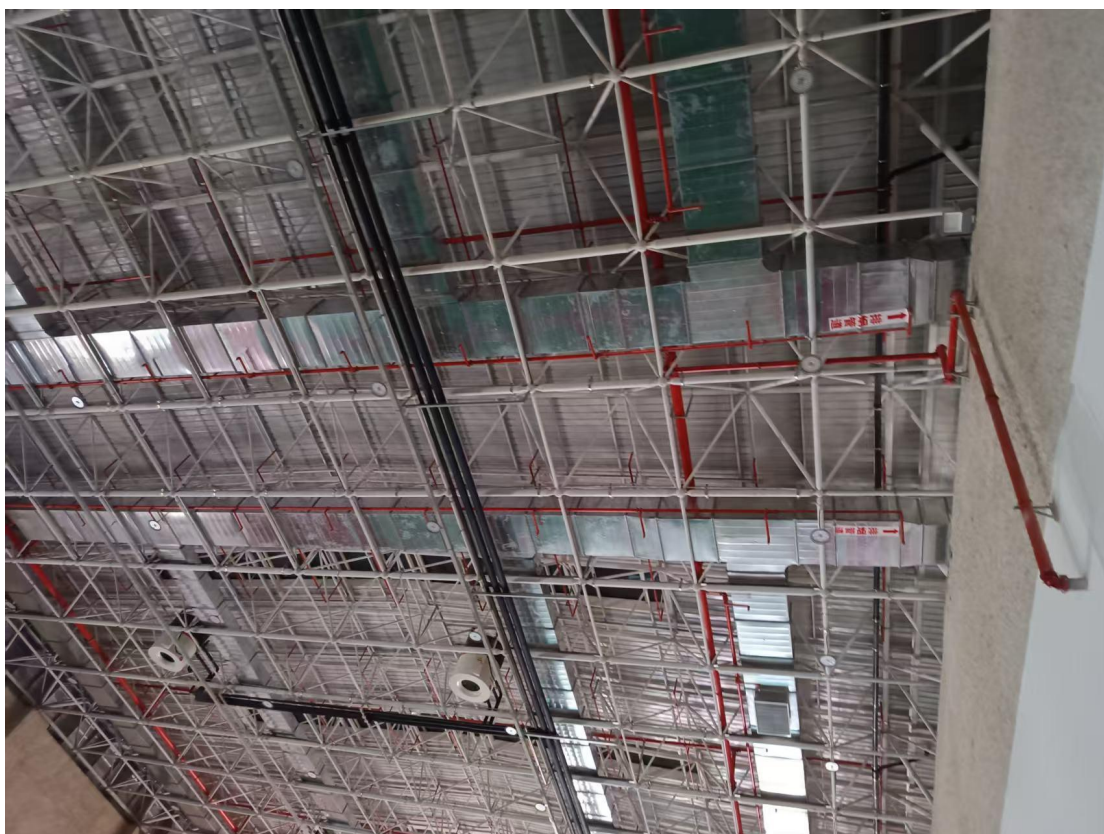

8、综合馆联动测试排烟风机未启动

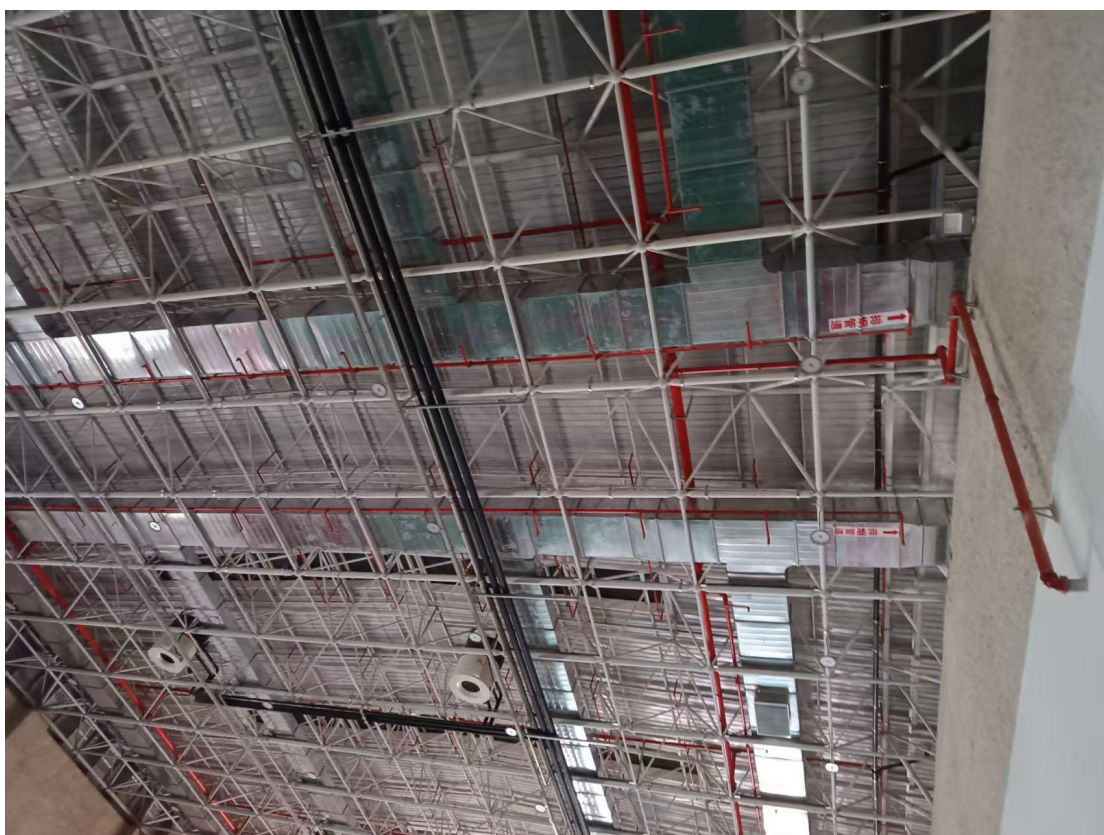

9、整体联动逻辑关系比较混乱，联动之后部分该动作的未动作，不

该动作的又动作

10、楼梯间送风阀多数无法复位关闭



11、三楼联动测试，非消防电源未断电


12、三楼排烟系统未启动

13、强切功能逻辑混乱

14、二层联动测试排烟风机未启动，风机控制箱损坏



15、一楼测试联动，部分常开电动防火门不能联动关闭

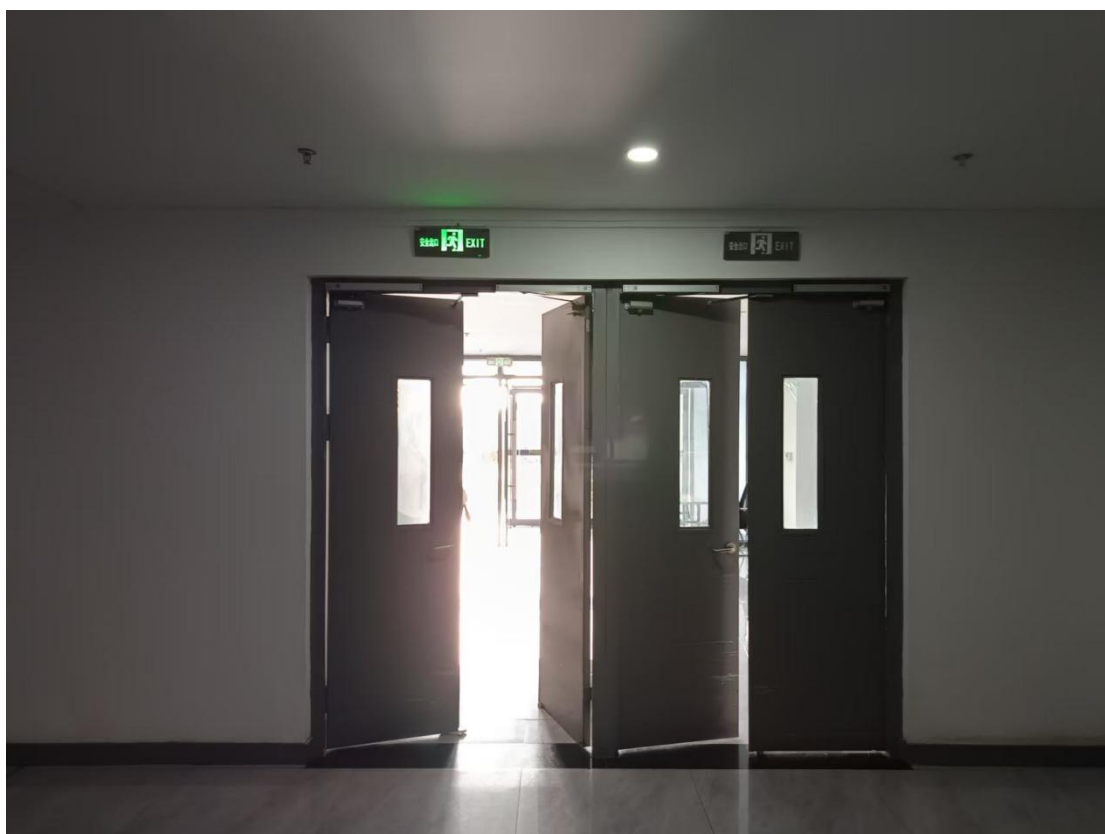

16、一楼体操训练馆排烟未启动

17、一楼联动测试应急照明未点亮

18、举重训练馆联动测试，排烟风机未启动，非消防电源未强切，应

急未启动

19、一楼跆拳道馆联动测试，非消防电源未强切

八、游泳馆

1、一楼联动测试，非消防电源未强切，应急照明和疏散未点亮，部分疏散指示灯损坏

2、一层排烟阀联动开启.排烟风机启动，风口没风

3、二层排烟阀联动开启.排烟风机启动，风口没风

4、检查风机，个别风机在手动，多数风机就地也无法启动，部分风机未联动启动



5、三层联动测试，非消防电源未强切，多数排烟风机未启动


6、负一层联动测试，排烟风机未启动，应急照明未点亮

九、餐厅

- 1、食堂楼梯间自然排通风位置较高，应设置就地手动开启装置，或者采用电动窗



- 2、食堂两部货梯联动测试未迫降

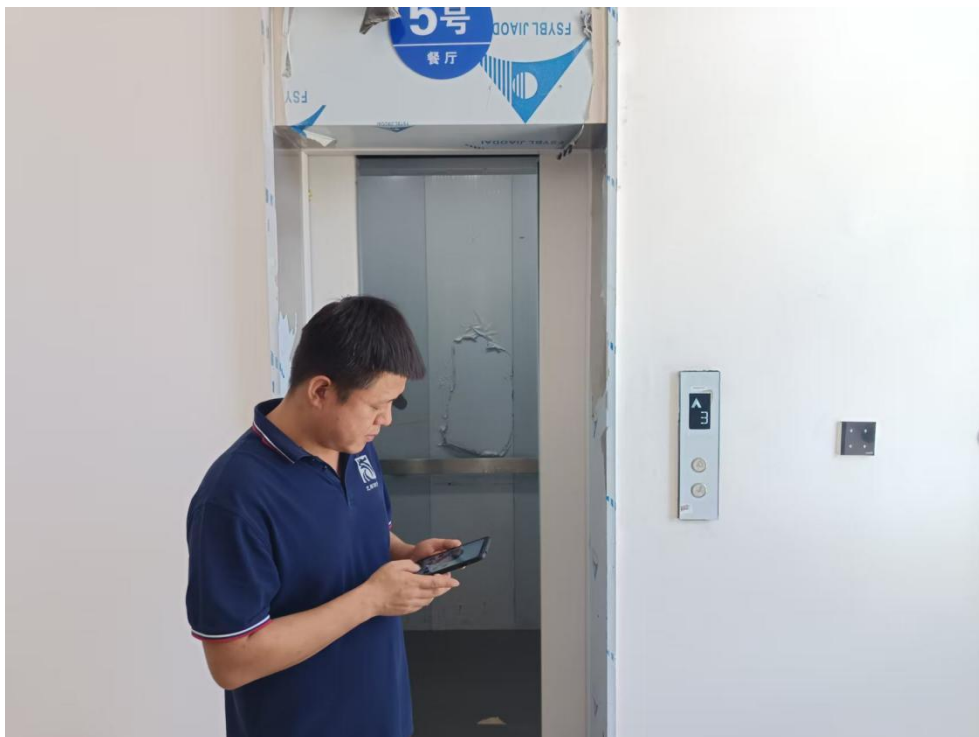

3、食堂一层电动挡烟垂壁部分不能联动降落



4、食堂电动挡烟垂壁无就地控制装置

十、外训楼

1、测试联动，两头前室送风机未启动



2、联动测试前室电动闭门器未动作



3、联动测试后，门禁未断电



4、消防联动测试，非消防电源未强切，应急照明和疏散启动

5、联动测试，梯间送风机未启动



6、6.四楼联动测试，排烟风机未启动，屋面检查所有风机均未供电

7、7.外训楼厨房可燃气体探测预警系统主机未供电




8、8.外训楼一二楼中庭处防火分割卷帘联动测试未动作



十一、射击击剑馆

- 1、一楼联动测试，非消防电源未强切，应急启动正常
- 2、10 米靶场联动测试，个别挡烟垂壁未正常下降

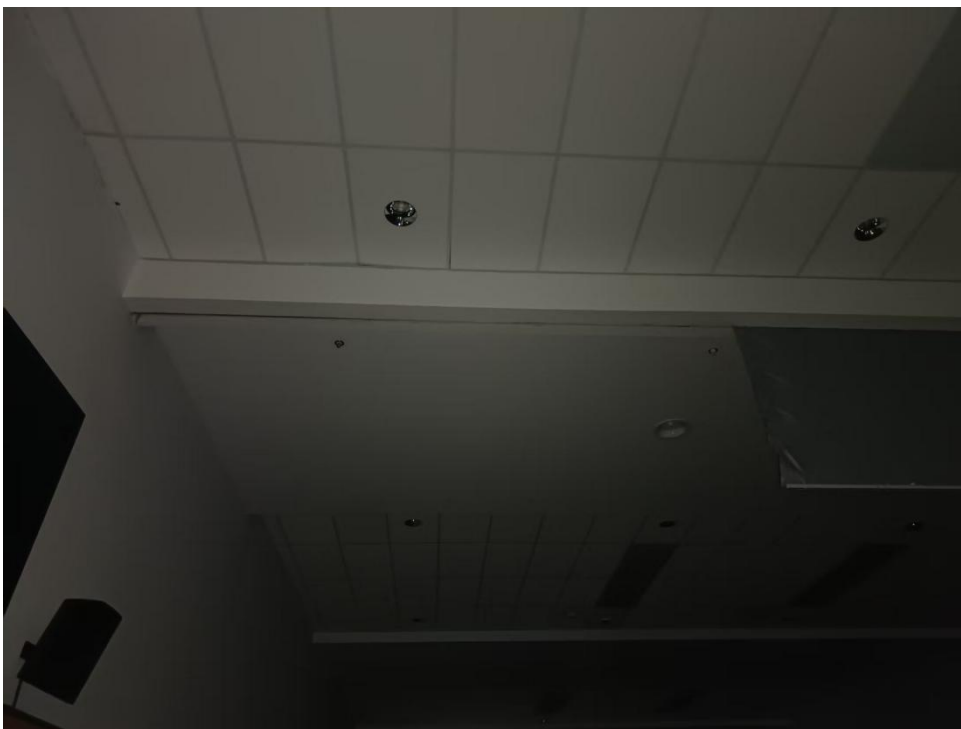

3、现场排烟阀手动执行机构部分损坏

4、50 米靶场联动测试，现场消防广播未正常启动

5、联动测试，东走廊排烟口开启无风速



6、击剑馆联动测试，部分挡烟垂壁未正常下降



7、击剑馆内部分排烟口只有进门口有风速，其余排烟口测试无风速

十二、地下车库

1、地下车库联动测试，疏散通道上的防火卷帘未采用两步降



2、地下车库所有排烟风机出口未通向室外





十三、气体灭火联动测试

1、科研楼 6 楼总机房气体灭火系统瓶头阀全部未接线



2、公寓楼高压配电官网气体灭火系统启动系统未接线



3、击剑馆配电室气体灭火主机备电故障，探测器保护罩未摘除



