



建筑工程甲级
A261145270

西安思维建筑设计研究院有限责任公司

Xi'an Thinking Architectural Design Research Institute CO.,LTD.


设计答疑

第 1 页

主送单位	蓝田县农业农村局	变更编号	
抄送单位	施工单位、监理单位、审图单位及相关建设主管部门	专业	市政
工程名称	2026年度中央、省级提前下达财政衔接资金（常态化帮扶资金）项目	工程编号	
项目名称	三官庙镇南湾岭村七组水毁道路维修项目	答复日期	2026.4

设计图纸答疑：

- 水泥混凝土路面未提供混凝土标号，请明确；
18cm 厚 C30 水泥混凝土
- 路面工程数量表中，挖土方605立方米，图纸无法算量，请明确具体位置及尺寸；
- 路面工程数量表中，填土夯实605平方米，图纸无法算量，请明确具体位置及尺寸；
- 防护工程数量表中，土方开挖425.37立方米，图纸无法算量，请明确具体位置及尺寸；
- 路面工程和防护工程中，土方开挖是否重复，请明确；
- 防护工程数量表备注中，土方清理是否与路面工程和防护工程中土方开挖重复，请明确具体位置；
2-6点回复如图所示
- 防护工程数量表备注中，拆除原有干砌挡墙，请明确挡墙材质及厚度。
拆除原有混凝土挡墙，厚度0.75cm

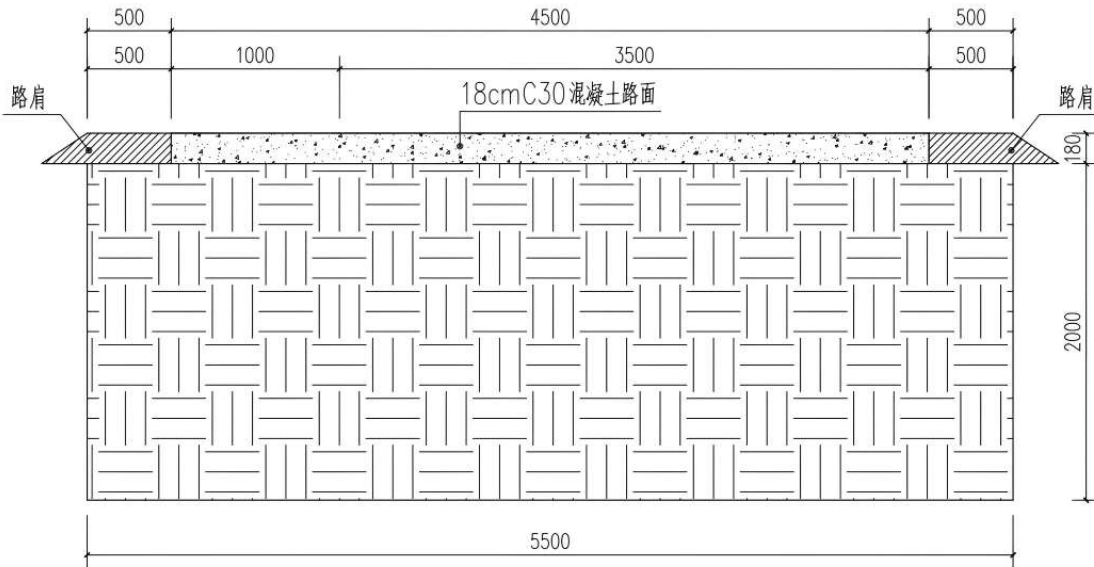

注：路面起点与挡墙起点一致，路面长度55m(终点位于路口处)，挡墙长度65m。

1、路面工程

(1) 路面挖土方长度55m，宽度5.5m，高度2m(不含原有混凝土路面厚度18cm)，共605m³。

(2) 道路填土夯实长度55m，宽度5.5m，高度2m，30cm分层回填夯实，共605m³。


2、防护工程

(1) 挡墙长度共65m，其中55m(高度6m)，10m(高度2-6m，终点处高度2m)。

(2) 土方清理指现状边坡土方清理，清理长度65m，为挡墙施工创造工作面。清理范围可根据现状及施工情况调整，需要格外注意坡脚稳定和机械操作安全。严禁一次到底或掏脚开挖，分层分段施工，每层开挖深度不超过2米，及时将坡面修整到位。清理出的土方应立即运走，严禁堆放在坡顶，避免增加边坡滑塌风险。

(3) 土方开挖指挡墙基础开挖，长度65m。

(4) 土方清理完毕后，方可进行基础土方开挖，两部分不重复。



设计	校对	审核	设计单位意见(盖章)
王锦汇	杨晓峰	赵通	(20)

注：无单位意见本单无效
