



镇巴简池镇中心小学运动场及附属工程图纸答疑

一、宿舍楼

1. 封堵窗口是否采用页岩实心砖？

回复：采用混凝土加气块，M5 混合砂浆。

2. 宿舍楼改造做法是否以图纸给定的“建筑装饰装修用料表”为准？

回复：是

3. 请明确宿舍楼浴室地面修补贴瓷砖的做法，原有地面是否需要拆除，如果需要拆除请给定原有地面材质

回复：选用图集陕 09J01，地 29。600*600 地砖地面（有防水）

4. 请明确宿舍楼浴室内墙面贴瓷砖的做法

回复：选用图集陕 09J01，内 112。300*600 釉面砖墙面。

5. 请明确宿舍楼原走道顶棚的做法

回复：白色涂料。

6. 浴室顶棚是否需要拆除后再做吊顶，请明确吊顶的做法

回复：原浴室不需要拆除吊顶。改造浴室做吊顶。选用图集陕 09J01，棚 60；300*300 铝合金方格吊顶。

7. 宿舍楼改造中，工程量是否以“工程量统计表”中给定工程量为准？

回复：是

8. 宿舍楼改造中，浴室更换的门是否为普通铝合金单玻平开门？

回复：普通铝合金安全钢化玻璃平开门

9. 宿舍楼改造中，浴室更换的窗是否为塑钢单玻推拉窗？

回复：塑钢中空玻璃推拉窗



10. 宿舍楼改造中，原外墙面是否为水泥砂浆抹灰面？

回复：不是。原外墙面是白色外墙涂料。

11. 宿舍楼改造中，原内墙面是否为水泥砂浆抹灰面？

回复：不是。原内墙面是白色内墙涂料。

12. 宿舍楼改造中，原浴室墙面是否为块料面层

回复：不是，原内墙面是白色内墙涂料。

13. 请明确热水器规格型号参数。

回复：100L 成品电热水器。

二、室外部分

1. 操场清理水沟是否为清理水沟中的淤泥，如果是请明确水沟的宽度及淤泥的深度

回复：水沟清理暂不计入

2. 更换水沟处混凝土盖板的具体做法，混凝土盖板是否为成品盖板及盖板的规格

回复：成品混凝盖板 50*30*6cm


3. 拆除部分总平面图中，图纸给定花池为拆除，改造后总平面图中，图纸给定花池为加高，请明确此部位应该是拆除还是加高？并分别给定花池的长度

回复：拆除和加高的花池不是同一个位置。原花池规格高度 30cm，材质为 120 厚砖墙砌筑，长度为 34m。舞台后的花池要拆除更换成品花箱。花池加高 30Cm 一共 107m，花池加高 20cm 一共 53m。

4. 围墙重刷涂料，是否需要铲除原有涂料，顶部树脂瓦请明确做法及



回复：需要。围墙高度 2.4 米，顶部树脂瓦采用砂浆 1:3 水泥砂浆卧瓦，瓦面积 $18 \times 0.6 = 10.8\text{m}^2$ 。

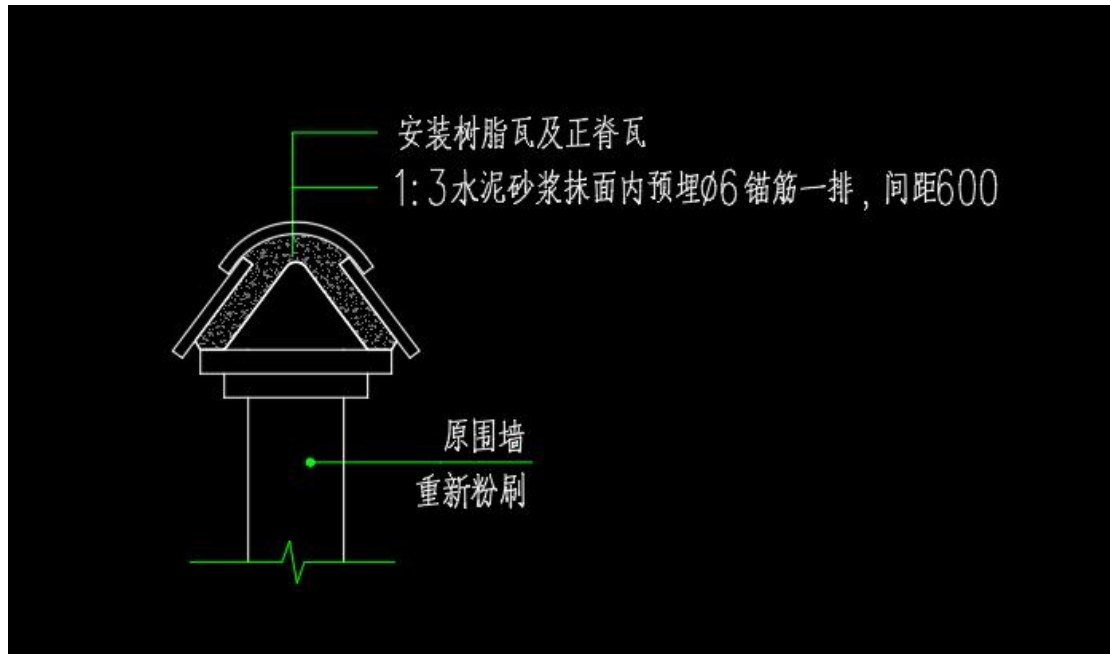

5. 6#楼已建建筑加轻钢雨棚，雨棚顶采用什么材质，厚度是多少

回复：4 厚 pc 耐力板

6. 改造后地面铺装总平图中篮球场与跑道做法一致，均为 13mm 厚塑胶面层铺地，但做法详图中篮球场做法与跑道做法不一致，请明确

篮 球 场 的 做 法




划线层-聚氨酯专用漆 0.1mm

耐磨面层-彩色EPDM+PU胶5mm（压实），配比1:6~7

弹性压实层-EPDM+PU胶8mm（压实），配比1:6~8，碾压2-3遍

0.2~0.3mm封闭底涂层，混凝土专用渗透底涂，滚涂2遍

原有混凝土地面，表面需做酸洗处理、打磨清理，含水率 $\leq 8\%$

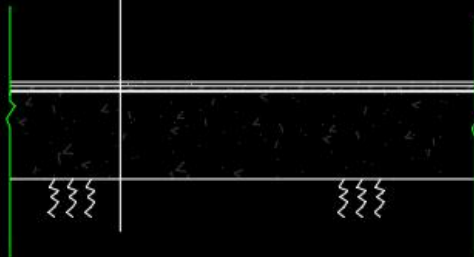

室外篮球场剖面图

7. 如果篮球场与跑道做法一致，请分别确认两种材质的工程量

回复：篮球场 428.64m²，羽毛球场 81.74*2=163.48m²；操场与跑道

做法一致 1920-428.64-163.48=1327.88m²

8.




请明确长度

回复：预估 15 米。

9. 舞台加高 20 公分。砖砌踏步一处。

回复：舞台面积 120m²，200 厚 C20 混凝土，踏步长度 2m

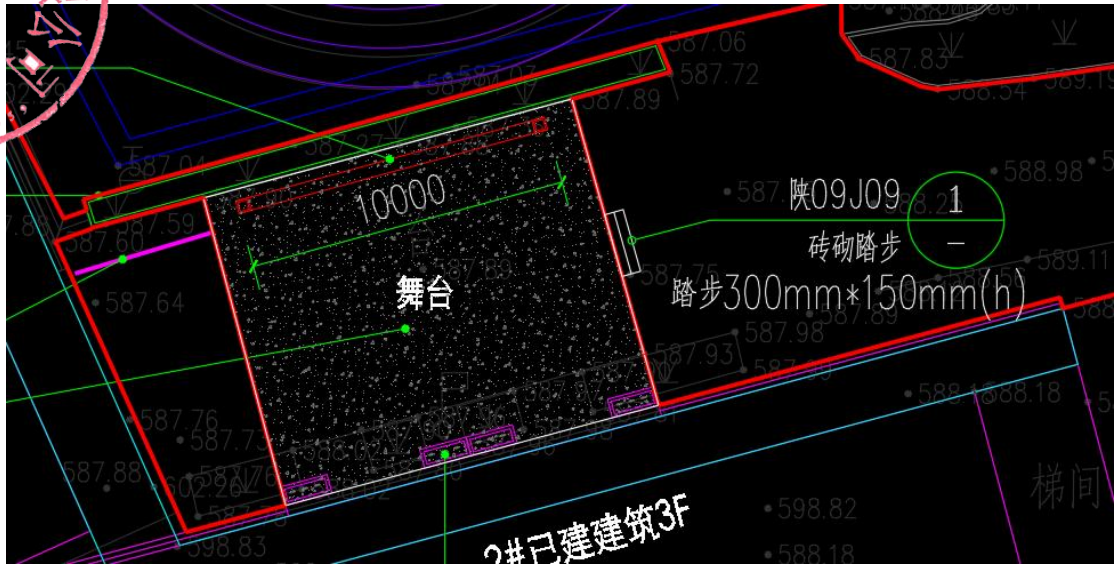

答：led 显示屏长 9 米。高 0.8 米。

答：此部分暂不计入
