宝鸡市凤翔区电子政务机房
升级改造项目采购合同

甲方：宝鸡市凤翔区数据局

乙方：陕西凤翔大数据发展有限公司

二〇二六年九月

甲方：宝鸡市凤翔区数据局

地址：宝鸡市凤翔区东大街39号（区政府大院）

乙方：陕西凤翔大数据发展有限公司

地址：宝鸡市凤翔区城关镇西城国际商业一楼

2026年9月9日，宝鸡市凤翔区数据局以竞争性谈判方式对宝鸡市凤翔区电子政务机房升级改造项目进行了采购。经博标工程咨询有限公司评定，陕西凤翔大数据发展有限公司为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经宝鸡市凤翔区数据局(以下简称：甲方)和陕西凤翔大数据发展有限公司(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.2 成交通知书；

1.3 谈判响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.4 谈判文件（含澄清或者修改文件）；

1.5 其他相关采购文件。

2.货物

2.1 货物名称：机房照明、综合布线、防雷接地、新风排风、消防、UPS、制冷系统、动环、安防监控系统、防火墙、上网行为管理、日志审计、核心交换机、接入交换机、光模块等，具体详见本合同分项价格清单；

2.2 货物数量：具体数量详见本合同分项价格清单，清单需列明每类货物的具体计量单位及对应数量，不得仅以“一批”模糊表述；

2.3 货物质量：货物质量应符合国家、行业标准及本合同约定的技术参数要求。本项目货物等整体质保期为三年，自项目终验合格之日起计算。质保期内，乙方应提供免费上门维修、更换、升级服务及7×24小时技术响应；接到甲方故障通知后4小时内到场处置，故障无法在8小时内修复的，应在24小时内提供不低于原性能的备用设备或更换全新设备，由此产生的全部费用由乙方承担。防火墙、上网行为管理、日志审计、核心交换机等核心设备的原厂免费保修、软件维护升级及特征库升级服务期限应覆盖本项目三年质保期。

3. 价款

本合同总价为：¥：895000 元（大写：捌拾玖万伍仟元人民币），含税。

序号	项目名称	品牌规格	数量	单位	单价（元）	总价（元）
一、机房建设						
1、机房基础建设						
1.1 拆除						
1	暖气管道	定制。机房内暖气片及管道拆除封堵	1	项	720	720
2	单开门拆除	定制。单开木门（独立办公室）	1	樘	130	130
3	双开门拆除	定制。双开木门（大门）	1	樘	150	150
1.2 装修						
1	窗户封堵	定制。清理窗洞基层并充分湿润，在原墙体上植入钢筋与红砖墙拉结，采用水泥砂浆错缝砌筑至顶部后塞砖挤紧，内外两侧抹灰找平。	5.4	㎡	260	1404
2	门洞封堵	定制。清理门洞基层并凿毛湿润，在原墙体上植入钢筋与红砖墙拉结，采用水泥砂浆错缝砌筑，顶部斜砌（或预留缝隙后塞砂浆），双面挂钢丝网抹灰。	1.68	㎡	250	420
3	双开防火门	定制。材质:珍珠岩防火门芯板甲级	3.6	㎡	730	2628
4	墙柱面找平	定制。铲除原腻子和乳胶漆，接缝处挂耐碱钢丝网，分层抹水泥砂浆找平压实收光，洒水养护，确保垂直平整无空鼓开裂。	116	㎡	18	2088
5	墙柱面刮白+乳胶漆处理	定制。刮白，刷乳胶漆不少于 2 遍，并打磨找平。	116	㎡	35	4060
6	不锈钢踢脚线	定制。5 公分成品型材踢脚线	36	m	43	1548
7	隔音墙	定制。贴南墙砌一道 12cm 红砖墙，两道墙中间加隔音棉，总体突出原墙面 16cm 厚。	32	㎡	290	9280
8	地面防尘处理	定制。清理地面浮灰杂物并打磨除尘，均匀滚涂防尘漆，封闭毛细孔隙形成致密防尘耐磨面层。	67	㎡	17	1139
9	防静电地板	鑫双威/600*600mm。基层地面弹线分格，安装可调支架及横梁，铺设 600*600mm 陶瓷面防静电地板并做好接地处理，调平缝隙后收口固定。	67	㎡	350	23450
10	防鼠板	定制。500mm 高不锈钢防鼠板	1	个	220	220
11	文件柜	国产。规格:850*390*1800mm，材质：冷轧钢	2	台	750	1500
1.3 照明						
1	led 平板长条灯	国产。材质：0.23mm 覆膜底盘+0.7PS+45 珠+拼接铝框； 功率：120W；尺寸：宽度 30cm，长度 120cm。	12	套	120	1440
2	安全出口灯	国产。出口位置指示，壁挂 式安装，AC220V 主电，DC36V 应急供电，LED 光源，应急 时长≥90min，IP30 阻燃壳体。	1	个	65	65

3	应急照明灯	国产。新国标 3C，双头应急 灯，壁挂安装，LED 光源， 单灯光通量≥300lm，DC36V 应急供电，应急时长≥ 90min，IP30 阻燃壳体。	2	个	65	130
4	开关	国产。双开，含底盒	2	个	26	52
5	墙座	国产。标准 86 型五孔插座	3	个	20	60
6	照明电源线	国产。ZR-BV2.5mm² 纯铜阻燃	2	卷	330	660
7	辅材	国产。JDG25、管件、膨胀丝、电工胶带、链条等。	1	项	500	500
1.4 综合布线						
1	网线	爱谱华顿/AP-6-01。6 类非屏蔽双绞线	600	米	3	1800
2	光跳纤	国产。单模，长度 8 米	40	条	30	1200
3	ODF 架（电信）	国产。96 芯，满配法兰	1	个	1500	1500
4	ODF 架（移动、联通、广电）	国产。24 芯，满配法兰	3	个	380	1140
5	PDU	国产。7 位五孔 10A+三孔 16A	16	个	235	3760
6	网格桥架	国产。规格:200*100mm	20	米	65	1300
7	金属桥架	国产。规格:200*100mm，厚度：1.2mm	20	米	110	2200
8	辅材	国产。水晶头，扎带、电工胶带、铜鼻子、PVC 管及管件、JDG 管、线槽、插排等。	1	项	1200	1200
1.5 防雷接地						
1	铜箔	国产。规格:100*0.3mm	67	㎡	76	5092
2	接地汇流铜排	国产。规格:30*3mm	26	米	125	3250
3	降阻剂	国产。防腐	375	Kg	5	1875
4	接地模块	国产。规格:400*500*60mm	10	个	155	1550
5	接地极	国产。规格:18*2500mm	10	根	168	1680
6	接地钢扁铁	国产。规格:40*4mm	60	米	35	2100
7	辅材	国产。主干接地线（BVR-16mm²）、设备接地线（BVR-6mm²）、铜鼻子、绝缘子、等电位箱、二级防雷模块、电工胶带等。	1	项	2300	2300
8	室外接地基坑施工	定制。接地沟槽开挖 27 米（1000*1000mm）、回填及绿植恢复；降阻模块安装（热镀锌管扁铁与降阻模块焊接连接）、降阻剂填埋、阻值测量等。	1	项	12500	12500
2、机房环境设备						
2.1 新风排烟						
1	新风排烟一体机	天方 HO8GA(L)。用电要求： 220-50-1；额定输入功率：450W；新风量 800m3/h；新风噪音 47db(a)；排风量 2100m3/h；排风噪音 56db(a)；排风余压：160Pa；外形尺寸：410*520*1620(1800)。辅材：ZR-BV2.5mm 电缆、防雨百叶等。	1	台	16500	16500
2.2 消防						
1	柜式无管网单瓶组	蓝天消防 GQQ120/2.5-LT。高压无缝钢瓶、容积:70L、贮存压力 2.5MPa（20 度）	2	套	2850	5700

2	七氟丙烷灭火药剂	浙江衢化 HFC-227ea。七氟丙烷 HFC-227ea	140	Kg	75	10500
3	泄压装置	江西淦虹 GHXY-0.12—J。含百叶和阀体,开孔尺寸:400*400mm	1	套	800	800
4	点型光电感烟火灾探测器	北大青鸟 JBF5101。分布智能型，电子编码，指示灯 360 度可见。内置消防报警专用芯片。底座 TBF-VB4301B。分布智能型，电子编码，指示灯 360 度可见。	1	只	65	65
5	点型感温火灾探测器	北大青鸟 JBF5113。分布智能型，电子编码，指示灯 360 度可见。内置消防报警专用 MICU 芯片。底座 JBF-VB4301B。	2	只	65	130
6	探测器底座	北大青鸟 JBF-VB4301B。材质：塑料；配接 TBF51004, JBF51104、TBF5000C	3	只	5	15
7	火灾声光警报器	北大青鸟 JBF5176A。二总线设备，电子编码，具有声和光的独立设置功能。配接底座 TBF-VB4301B。	2	只	130	260
8	火灾声光警报器底座	北大青鸟 JBF-VB4301B。材质：塑料；配接 5174，5176A 使用。	2	只	5	10
9	气体释放显示灯	北大青鸟 JBF5180。二总线设备，电子编码。外形尺寸:353mm 长 x143mm 高 x24mm 厚。	1	只	180	180
10	紧急启/停按钮	北大青鸟 JBF5181C。用于气体灭火控制系统，安装在气体防护区外侧，用于紧急启 动喷洒设备动作或是在喷洒延时 时间结束前紧急撤销喷洒启动命令的设备。通过无极性一点线接入灭火控制器的灭 火回路。电压：DC19V-28V；线制：两线制。	1	只	100	100
11	气体灭火控制器	北大青鸟 JBF52S03。电压：AC220V 接口：1 个报警回路，1 个联动灭火回路。系统容量：最大支持带载数量 80 点 安装方式：壁挂式单区报警。	1	台	3500	3500
12	信号线	津达 RVSP2*1.5mm² 铜芯阻燃。	1	卷	450	450
13	辅材	国产。JDG25 管、管件、膨胀丝、电工胶带等。	1	项	1000	1000
2.3 UPS						
1	精密配电柜	艾晨数能，定制。 1、满足不少于 2 路 UPS 接入； 2、ATS 双路市电输入 200A/4P； 3、标配 UPS 输入、输出空开不少于（2*160A/3P），维护旁路空开不少于（1*160A/3P），空调及照明配电不少于（2*63A/3P+4*16A/1P），IT 机柜配电不少于（18*32A/1P+18*32A/1P）；所有开关均布置到柜体前面，便于维护；	1	台	26500	26500

		4、彩色触摸屏、主、支路监控，配 C 级防雷器； 5、进出线方式：上进上出； 6、开关品牌为施耐德。				
2	UPS 主机	艾晨数能 TT030L。 1、UPS 主机为三进三出不低于 30kVA 在线式高频塔式 UPS，支持输入电压 380/400/415V(线电压)，输入频率范围 40～70Hz； 2、为保证 UPS 产品的高效节能、绿色环保，UPS 输入功率因数≥0.99，整机最大效率≥96%； 3、具备丰富的显示界面，能直观地查看 UPS 本地记录及 UPS 设置功能，屏幕≥7 英寸； 4、UPS 系统集成不小于 128M Flash，支持不低于 10 万条本地历史记录和历史数据存储，还可支持外扩 SD 卡，实现无限制数据存储； 5、UPS 机柜内需要集成独立主路输入空开、旁路输入空开、输出空开以及维修旁路空开，便于用户接线。	1	台	33500	33500
3	铅酸电池	艾晨数能 LEAD100-12。 12V100AH 铅酸电池	32	节	790	25280
4	电池架	定制。组装式，4 层 2 列，尺寸定制	1	套	1800	1800
5	电池架内部电池之间连接线	国产。铜排电镀，含电线护套和串入式铜排护套。	1	套	1300	1300
6	汇流箱到UPS主机线缆	津达 BVR16mm²	18	米	23	414
7	电池开关柜	国产定制。1*100A/3P 塑壳，国产知名品牌开关	1	台	900	900
8	PDU 线缆	津达 BVR4mm²（8 台机柜，每台机柜两套 PDU 线缆）	150	米	7	1050
9	UPS 输入输出线缆	津达 YJV5*10mm²（精密配电柜至 UPS 主机输入、输出各一路）	10	米	65	650
10	市电主缆	津达 YJV4*70+1*35mm²（户外高压取电处到精密配电柜）	30	米	430	12900
2.4 制冷系统						
1	精密空调	艾晨数能 MA030FA2E23/FA040APN 。房间级精密空调，上前送风，制冷量不低于 30.5kW，变频，EC 风机，恒温恒湿型，不小于 7 英寸触控屏幕，R410A， 风冷，再加热量不低于 6kW， 加湿量不低于 5kg/h;电源 380V/50Hz，常温，RoHS;含室内机和室外机。	1	套	70800	70800
2	液体管	国产。直管，规格：16mm	15	米	180	2700
3	气体管	国产。直管，规格：22mm	15	米	205	3075
4	防水围堰	定制。尺寸:1200*1200mm	1	项	800	800

5	承重支架	定制。精密空调 2 个（室内机、室外机），精密配电柜 1 个 ，电池架 1 个，机柜 8 个。材质：铁质，定制加工。	12	个	500	6000
6	线缆	津达 YJV4*10+1*6mm²（精密配线柜--室内机、室外机）	50	米	55	2750
7	空调辅材	保温棉、胶带、制冷剂、PPR25 进水排水管等。	1	套	2500	2500
8	空调外机防护格栅	材质：不锈钢刷漆防锈，定制。	1	项	1500	1500
2.5 动环						
2.5.1、监控主机与后台系统						
1	监控主机	艾晨数能 AC-PEDMs。 1、1U 机架式结构，带网口设计，带 USB 接口； 2、配备经过专业优化的动环监控系统，系统运行安全、流畅、稳定； 3、不少于 4 路独立 1+1 冗余 RS485 通讯接口（RJ45 形式），支持接入多台 UPS、精密空调、精密配电和其它多种智能传感器； 4、支持其它品牌的智能设备协议开发； 5、支持 TF 卡容量扩展，告警事件、操作日志和相关数据记录存储时间最长可达 10 年； 6、支持声光、短信、电话和邮件等告警方式； 7、具有多级用户管理权限，防止无关人员越级操作； 8、支持远程网络访问设备及手机 APP 登陆、监控设备； 9、具有双路电源供电，且内置后备锂电池，系统临时停电可不间断监控系统及环境工作状况。	1	台	24500	24500
2	串口 IO 控制器	郎汉德 LH-IO808。不少于 8 路输入、8 路输出(其中 4 路常开，4 路常开/闭):工作电压: DC9-28V:通讯接口: 隔离 RSRS232:标准 DIN35mm 号轨安装。	1	个	480	480
3	外部声光报警器	秦阳电气 LTD-1101J-12V-RED。磁吸 式,LED 灯珠,模拟旋转,有声,红色。	1	个	80	80
4	电话语音模块 4G	速力思 S80-A3-VSVW04-B01。 全网通 4G，同时支持短信和电话语言告警。	1	套	450	450
5	接口开发	定制开发，包含：温湿度、烟感、漏水、ups、空调、配电、视频监控、门禁等系统数据接口。	1	项	4000	4000
2.5.2、机房环境参量监控系统						

1	烟雾传感器	泛疆 JTY-GD-T12。点型光电感烟火灾探测器，继电器干接点输出。供电电压：8～24VDC；监控电流：＜4mA(24V) 、火警电流：＜30mA(24V)；工作环境温度：-10℃-+50℃；工作环境湿度：＜95%；指示灯：绿色正常，红色火警。	2	个	120	240
2	温湿度传感器	艾晨数能 AC-THW。温度检测-20℃～85℃(精度±0.2℃)，湿度检测 0～100%RH(精度±2%)，工作电压 DC12V(6-20V)，RS485 通信输出，MODBUS-RTU 协议。	2	个	230	460
3	非定位水浸检测控制器	艾晨数能 AC-THW。漏液检测范围 150m(精度 0.5% FS)，漏液检测响应时间<5s(可设置)，工作电压 DC12V(6-20V)，RS485 通信输出，MODBUS-RTU 协议。	1	个	755	755
4	非定位感应线 5M	祥为 XW1100-5M。非定位漏水监测线缆，单个长度不少于 5m，不可扩展连接；	1	条	180	180
5	POE 交换机	华为 S5735R-L24P4S-A-V2。 1、采用国产化芯片和国产化操作系统。 2、交换容量:≥672Gbps，包转发率:≥126Mpps 3、固定端口:≥24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个千兆 SFP，支持 POE，POE 供电功率≥400W 4、支持静态路由、RIP、OSPF 等路由协议 5、支持环网保护协议 6、支持 SNMP，RMON 等 7、支持端口镜像	1	台	2850	2850
2.5.3、辅材						
1	辅材	JDG25 管、RVSP2*1.5mm² 铜芯阻燃信号线、UTP6 网线、水晶头，扎带、电工胶带等	1	项	1800	1800
2.6 安防监控系统						
1	红外网络半球摄像机(200 万)	大华 DH-IPC-HDW3233T-A，满足国产化要求，200 万高清监控摄像头，带 POE 功能；支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输；内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 50 米。	3	个	380	1140
2	8 路硬盘录像机	大华 DH-NVR4808-4KS2/I，满足国产化要求，支持 8 路网络视频接入； 支持 Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG 码流；支持 8 个内置 SATA 接口，单盘容量支持 10T；支持 IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF 网络协议；支持 2 个千兆以太网口，支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入。	1	个	1050	1050
3	4TB 监控级硬盘	希捷。监控级硬盘 -4TB-256MB-5400RPM-3.5 英寸-SATA 接口	1	个	800	800
4	门禁一体机	ZKTeco 熵基 TDB08M。解锁方式：指纹、工号、密码、IC 卡；可单独使用。	1	套	2000	2000

5	双门磁力锁	ZKTeco 熵基 AL-280D。双门磁力锁，承受拉力 280kg，DC12V，锁带 NO/NC 输 出。	1	个	350	350
6	IC 卡	ZKTeco 熵基 IC 卡，白卡，13.56MHz，读写距离 2.5-10cm，86*54*0.87mm	5	张	15	75
7	信号线	津达 RVSP2*1.5mm² 铜芯阻燃	80	米	4.5	360
8	网线	爱谱华顿 AP-6-01。6 类非屏蔽双绞线	300	米	3	900
3、其他						
1	设备搬迁	从 4 楼（无电梯）原机房将利旧机柜（8 个机柜）和部分设备（5 台国网设备）搬迁至新机房。	1	项	8000	8000
2	垃圾清运	原有基础装修材料及施工产生其它垃圾清运	1	项	2450	2450
3	吊牌标牌制作	机柜标号、制度牌、网线标签等	1	项	800	800
4	施工	1、墙面开洞（新风机出风口、空调给排水口、市电入户口）；2、机房内静电泄漏网铺设、铜排铺施工；3、精密空调、UPS 安装、精密配电柜的安装及布线、布管等；4、消防及动环系统各设备布线、安装；5、机柜及各设备接地；6、机柜布线（网线、电源）；7、熔纤；8、对原机房设备、线路梳理、标记并登记，对新机房设备、线路梳理，标记和登记；9、网络设备、安全设备安装和联调联试等。	1	项	23000	23000
二、网络和安全设备						
1	防火墙	奇安信 NSG4300-FT15。采用国产化芯片和国产化操作系统。 基础性能：网络层吞吐量 30G，并发连接 1200 万，每秒新建连接数 16 万。 系统架构：标准 2U 机箱，冗余电源；板载 6 个千兆电口， 4 个千兆光口，4 个万兆光口 （带自适应光模块）；2 个扩 展插槽，1 个 Console 口，1 个 HA 接口，1 个 MGT 接口， 256GBSSD 固态硬盘存储，支持扩展存储硬盘，2 个 USB 接口，支持液晶屏。 其他要求：支持应用控制功能、URL 过滤功能、病毒防护 功能、入侵防御功能、威胁 情报检测功能；32 个 IPsecVPN 标配并发隧道数， 最大并发隧道数 5000 个；含 232 个 SSLVPN 标配并发用户数，最大并发用户数 500 个。 服务承诺：硬件产品提供 3 年的原厂免费保修、维护。 含 3 年免费软件维护升级、 特征库升级服务。 功能指标：1、基础防火墙功能：可基于源安全域、目的安全域、源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源用户、源地址、目的地址、源地区、目的地区、服务、应用、隧道名称、时间、VLAN 等因素设置安全策略，安全策略可直接调用漏洞防护、防间谍软件、WEB 攻击防护、反病毒、RUL 过滤、内	1	台	115500	115500

		容过滤、文件过滤、邮件过滤、行为管控、DNS过滤、联动终端管控等安全业务模板，安全策略动作支持允许、拒绝和隧道，当阻断数据包通过时可针对TCP会话反馈reset报文，针对UDP/ICMP会话反馈ICMP不可达报文。 2、产品支持透明部署进行SSL解密，支持解密TLS1.3、TLS1.2、TLS1.1、TLS1.0、SSL3.0协议。 3、产品具备LLDP功能，可以向网络中其它节点公告自身的存在，并保存各个邻近设备的发现信息，如设备配置和设备识别等详细信息。 4、产品支持共享上网检测功能，支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作。 5、产品需具备中国信息安全测评中心颁发的自主原创证书，产品安全核心功能实现自主研发。 6、为保障符合安全合规要求，产品制造商需提供信息系统建设和服务能力评估（CS4）证书。 7、为保障产品安装调配，产品制造商需提供CCRC信息安全服务资质-软件安全开发一级证书。				
2	上网行为管理	奇安信 NBM-GCH-5350-F，采用国产化芯片和国产化操作系统。 基础性能：适配带宽 1G，用 户数 15000 人； 系统架构：标准 2U 机箱，冗 余电源；板载 6 个千兆电接 口，电口支持 2 对 BYPASS（1 个管理接口和 1 个 HA 接口）， 4 个万兆光口，提供 2 个扩展 插槽，2T 硬盘。 服务承诺：硬件产品提供 3 年的原厂免费保修、维护。含 3 年免费软件维护升级、特征库升级服务。 功指标： 1、上网审计功能：支持基于网页浏览、网页搜索、发帖、邮件、文件、IM、数据库、HTTPS、FTP、TELNET、DNS、SNMP、NFS、NETBIOS的上网审计功能。 2、可视化风险呈现：提供可视化的首页风险面板及监控中心，可集中呈现上网行为风险等级状态以及行为状态，并可展示特征库规模详情。 3、资产管理功能：支持通过主动探测和被动识别的方式实现网络中设备资产以及数字资产的发现与管理。 4、访问质量监测功能：支持Web访问质量监测功能，可对监测对象的Web 访问质量实时监测，对当前网络诊断的结果进行评级。	1	台	137000	137000

		5、特征库规模要求：分类网站数量2.8亿，应用数量16000，SAAS应用数量3600，内置审计规则数12000，内置应用规则数90000。 6、产品具备网络安全专用产品安全检测证书或网络关键设备和网络安全专用产品认证证书。 7、为保障符合安全合规要求，产品制造商需提供信息系统建设和服务能力评估（CS4）证书。 8、为保障产品安装调配，产品制造商需提供CCRC信息安全服务资质-软件安全开发一级证书。				
3	日志审计	奇安信 LAS-PKQ2M，采用国产化芯片和国产化操作系统。 基础性能：综 日志处理性能达 3000 条/秒(EPS)，日志采集处理均值 6000EPS。系统架构：标准 2U 机箱，冗余电源；板载 6 个千兆自适应电口，4 个千兆光口，4 个万兆光口，1 个扩展插槽，1 个 Console 接口；内置 256GBmSATA 卡，可插拔 4TBSATA 硬盘。 功能要求：≥60个日志源接入授权，覆盖主流设备与系统。 服务承诺：硬件产品提供3年的原厂免费保修、维护。含3年免费软件维护升级、特征库升级服务。 功能指标： 1.日志解析规则定义功能：支持对接入日志进行正则进行解析，并能自动生成正则表达式来提取日志属性，支持对接入日志进行 JSON 、Key-Value、分隔符或数组解析。 2.等保大屏展示功能：等保大屏界面支持查看设备运行天数、日志源数量、原始日志数、关联事件数、告警总数、等保合规情况、本地最早日志产生时间、已保存日志天数、平均每天日志存储量、存储空间情况、日志源列表、登录失败用户分布等信息。 3.长日志审计功能：日志审计平台能采集接收4/8/16/32/64KB长日志，且日志无截断现象，日志完整，提供CNAS认可检测机构出具的针对软件功能的检测报告关键页证明并加盖产品制造商公章。 4.日志加密转发功能：日志审计平台可根据字段需求选择性转发并转发日志可加密，提供CNAS认可检测机构出具的针对软件功能的检测报告关键页证明并加盖产品制造商公章。 5. 为保障符合安全合规要求，产品制造商需提供信息系统建设和服务能力评估（CS4）证书。 6、为保障产品安装调配，产品制造商需提供CCRC信息安全服务资质-软件安全开发一级证书。	1	台	117500	117500

4	核心交换机	华为 CloudEngine S8700-6 1。 1.采用国产化芯片和国产化操作系统。 2、交换容量 102.4/460.8 Tbps，包转发率 76800Mpps，以官网最小值为准； 3、主控槽位 2 个，业务槽位 4 个，电源槽位 4 个； 4、支持 RIP、OSPF、ISIS、 BGP 等 IPv4 动态路由协议，支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等； 5、支持 Telemetry； 6、支持 CPU 保护技术； 7、支持 SNMPv1/v2/v3 等网 络管理协议； 8、实配：双主控，双电源， 万兆光口 48 个，千兆电口 48 个，千兆光口 48 个，提供原 厂质保 3 年。	1	台	111800	111800
5	光模块	华为 SFP-GE-LX-SM1310。光 模块-eSFP-GE-单模模块（1310nm,10km,LC）	24	块	165	3960
6	接入交换机	华为 S5735R-L24T4S-A-V2 1、采用国产化芯片和国产化操作系统 2、交换容量：672Gbps，包转发率： 126Mpps 3、固定端口： 4 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个千兆 SFP 4、支持静态路由、RIP、OSPF 等路由协议 5、支持环网保护协议 6、支持 SNMP，RMON 等 7、支持端口镜像	1	台	2800	2800
总价						895000

4.付款方式和发票开具方式

4.1 付款方式：合同签订生效后，乙方提交合同总价款 40%的合格发票，甲方支付合同总价款的 40%；项目初验合格且乙方提交对应金额的合格发票后，甲方支付合同总价款的 30%；项目终验合格后 30 日内，由甲方委托的审计机构完成审计，乙方提交对应金额的合格发票后，甲方按照审计确认的最终价款，在扣除已付款项的基础上支付剩余款项。

4.2 发票开具方式：乙方应在甲方付款前 10 个工作日内，向甲方开具对应金额的合法有效增值税普通发票，乙方未提供符合要求的发票的，甲方有权顺延付款且不承担违约责任。

5.货物交付期限、地点和方式

5.1 交付期限：自合同签订之日起 90 个日历天内完成全部供货、施工、安装、调试、联调联试，确保系统整体正常运行并通过终验；

5.2 交付地点：甲方指定地点；

5.3 验收及交付方式：货物到达甲方指定交货地点后，甲方根据合同对货物的名称、品牌、规格、型号、产地、数量等进行检查，检查通过的，视为初验合格。所有货物安装调试完成后，连续试运行不少于 3 个月，且试运行期间各项性能指标均符合合同约定及甲方实际使用需求的，乙方应向甲方提出终验申请，由甲方组织终验。甲方收到乙方终验申请后 15 个工作日内未组织验收且未提出书面异议的，视为终验合格；终验合格后，甲方签发《终验合格单》。终验不合格的，乙方应在甲方指定期限内完成整改并承担全部整改费用，整改完成后重新申请验收；整改后仍不合格的，甲方有权拒付对应款项、解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并承担相应违约责任。乙方负责将全部货物运输至甲方指定地点，完成安装调试并通过终验后，视为交付完成。

5.4 供货时提供包括但不限于以下资料：

5.4.1 产品合格证；

5.4.2 产品使用说明书；

5.4.3 厂家对该产品的出厂配置清单；

5.4.4 其他相关资料；

5.4.5 核心产品须提供合法来源证明材料，包括但不限于原厂厂家授权、厂家营业执照、生产许可、产品检测报告等。

乙方在项目实施过程中接触到的所有网络配置、系统账号、安全策略等信息，仅限用于本项目实施目的，不得复制、泄露、向第三方提供或用于其他用途，项目完成后应立即删除所有留存的甲方涉密及敏感信息。

本项目实施过程中产生的所有项目文档、系统配置数据、运行监测数据，全部归甲方所有，乙方不得擅自使用、复制或向第三方提供。

乙方对项目实施过程中的施工安全、人员安全、设备安全承担全部责任，如因乙方原因造成甲方设备损坏、业务中断、数据丢失或人员伤亡的，乙方应承担全部赔偿责任。

乙方违反本合同第 5.4 条约定，未提供或未按约定时限提供产品合格证、原厂授权、检测报告等资料的，每缺少一项应向甲方支付 2000 元违约金。

乙方交付的核心产品（防火墙、上网行为管理、日志审计、核心交换机等）非原厂正品或不符合采购文件技术参数要求的，甲方有权要求乙方更换为符合要求的产品，并要求乙方支付该产品价格 50%的违约金。

6. 违约责任

6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，甲方有权要求乙方支付违约金。违约金按每迟延交付一日的本合同总价的0.5%计算，最高限额为本合同总价的30%。乙方迟延交付超过7日的，甲方有权单方解除本合同；乙方除支付违约金外，还应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

6.2 除不可抗力及因财政资金拨付审批流程、国库集中支付制度、政府审计等非甲方主观原因导致的付款延迟外，在乙方完全满足本合同约定的全部付款前提条件后，如甲方未按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金。违约金按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率折算的日利率，以应付而未付款金额为基数计算，最高限额为本合同总价的15%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。

6.3 除不可抗力外，任何一方严重违反本合同约定的主要义务且经对方书面催告后30日内仍未纠正的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；乙方存在分包、转包行为，或擅自将合同权利义务转让给第三方的，甲方有权单方解除合同并要求乙方支付合同总价20%的违约金；

6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照实际损失情况要求违约方赔偿损失；甲方按照前述约定解除合同的，乙方应在收到解除通知后10日内退还甲方已支付的全部款项，并支付违约金及赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

6.6 乙方保证所交付的全部货物、服务不侵犯任何第三方的合法权益，如因此引发任何纠纷，全部责任由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿。

7.合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，由宝鸡市凤翔区人民法院管辖。

8. 送达地址确认

双方确认本合同首页所列的地址为各自的有效送达地址，任何书面通知按该地址邮寄即视为送达；若一方变更送达地址，需提前 7 日以书面形式通知对方，否则按原地址送达的视为有效送达。

9. 合同生效

本合同一式陆份，甲方、乙方各执叁份，自双方签字盖章生效。

甲方：宝鸡市凤翔区数据局

法定代表人或授权代表（签字）：

开户银行：中国工商银行股份有限公司宝鸡凤翔区支行

开户账号：2603022092200196417

日期：2026 年 9 月 17 日

乙方：陕西凤翔大数据发展有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

开户银行：中国建设银行股份有限公司宝鸡凤翔区支行

开户账号：61050162720800001125


日期：2026 年 9 月 17 日

授权委托书

委托人 李孟燕 （身份证号：650108198110030029）委托 严俊豪 （身份证号：610524200104267614）办理我单位 区级电子政务机房升级改造项目合同签订事宜。委托期限：自签字之日起至上述事项办完为止，其从事与该事项有关的行为，所产生的法律后果由我单位负责。

委托人、被委托人身份证：



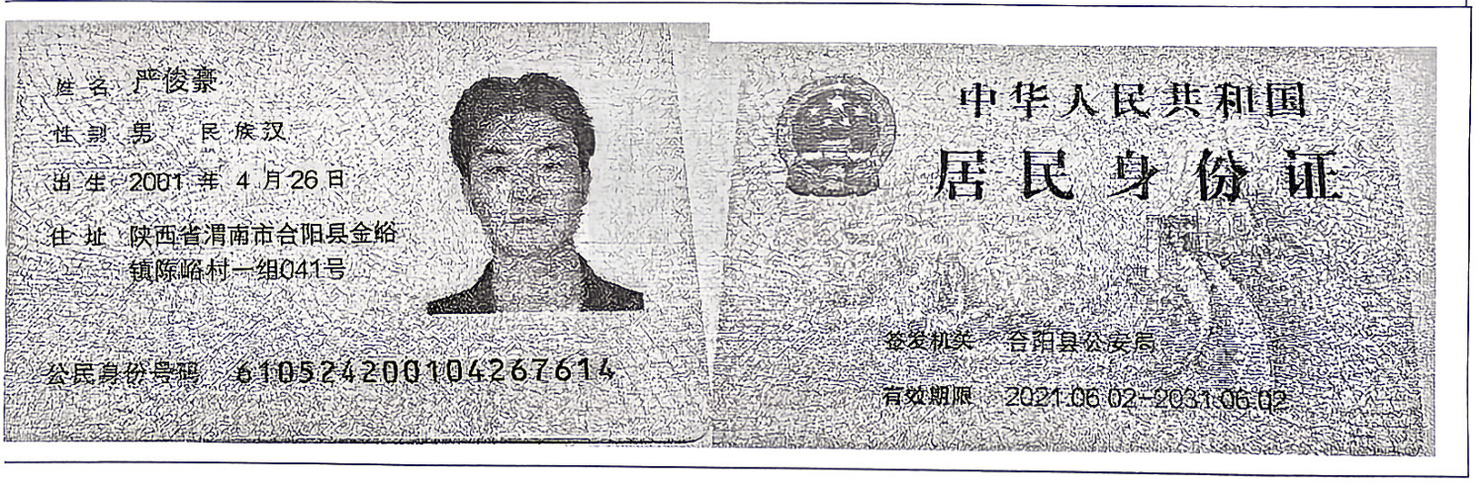

法定代表人/个人（签字）：李孟燕 被委托人（签字）：严俊豪

联系电话：13029140712 联系电话：15191866755

2026 年 9 月 1 日 2026 年 9 月 1 日
